

# รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ  
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

โทร ๐๓๔ - ๙๖๐๘๑๗

## คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลเป็นขั้นตอนหนึ่งของการวางแผน ที่มีความสำคัญเพราะการติดตามและประเมินผลจะเป็นตัวชี้วัดและบอกให้ผู้วางแผน ผู้ปฏิบัติตามแผน ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ทราบว่าแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้และนำไปปฏิบัติ ซึ่งเสียทั้งเวลา กำลังแรงงานและงบประมาณ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วได้ผลออกมาเป็นอย่างไร บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด และสามารถนำผลการประเมินมาตัดสินใจว่าจะดำเนินการตามแผนงาน / โครงการนี้ต่อไปหรือไม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
พศจิกายน ๒๕๕๙

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ ๑ : บทนำ	๑-๕
บทที่ ๒ : กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล	๕-๗
บทที่ ๓ : การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	๘-๑๗
แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปีของท้องถิ่น	๘-๙
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐-๑๗
- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)	๑๐
- โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ที่สอดคล้องสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๑
- จำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) และตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙	๑๒
- ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๕๙	๑๓-๑๔
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	๑๕
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙	๑๖
- ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	๑๖
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	๑๗
บทที่ ๔ : สรุปผลและข้อเสนอแนะ	๑๘-๒๐
สรุปผลการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	๑๘
สรุปผลการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	๑๘
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ	๑๙
<b>ภาคผนวก</b>	
คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ	
คำสั่งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ	
รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานการติดตามและประเมินผลฯ	
ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ	

## บทที่ ๑

### บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการทำงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ โดยประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การประเมินการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยการเปรียบเทียบระหว่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ห้วงปี ๒๕๕๙ กับแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องใกล้เคียง สำหรับใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการทำงานในปีต่อไป

#### วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

"นครปฐมเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย มีแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน"

#### พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ ด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

## **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม**

### **๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

- ๑.๑ พัฒนาการศึกษาระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน
- ๑.๒ ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานรัฐพิธี
- ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
- ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๑.๕ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถาน และศาสนสถาน

### **๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

- ๒.๑ พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน
- ๒.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME
- ๒.๓ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒.๔ ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน
- ๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการกระจายสินค้า พัฒนาเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม

### **๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

- ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
- ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข
- ๓.๓ แก้ไข ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด
- ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม
- ๓.๕ การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๓.๖ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๓.๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
- ๓.๘ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

### **๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว**

- ๔.๑ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ
- ๔.๒ บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ และการป้องกันน้ำท่วม และน้ำเสีย
- ๔.๓ การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ
- ๔.๔ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

๔.๕ พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่

๔.๖ การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

#### ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

๕.๒ ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤตินิยมชอบในการปฏิบัติราชการ

๕.๓ ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

๕.๔ ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร

๕.๕ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่

๕.๖ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น

๕.๗ สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ กระบวนการยุติธรรม และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี

#### ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๖.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้ำ ทำเทียม เรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมแซม ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย

๖.๒ พัฒนาระบบจราจร อลัการคมนาคมขนส่ง

๖.๓ พัฒนาระบบไฟฟ้า - ประปา

๖.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

๖.๕ พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค - บริโภค การเกษตร และอื่น ๆ

#### การวางแผน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสาม ปี ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๕๙		๒๕๖๐		๒๕๖๑	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๖๑	๗๘,๑๐๐,๐๐๐	๒๘	๔๑,๐๕๐,๐๐๐	๓๐	๓๕,๔๕๐,๐๐๐
ด้านเศรษฐกิจ	๖๘	๑๕๘,๐๕๘,๖๔๐	๖๒	๑๕๓,๙๔๕,๑๖๐	๕๖	๑๖๙,๘๒๓,๖๓๐
ด้านสังคม	๘๓	๘๘,๐๕๐,๐๐๐	๓๗	๒๖,๓๐๐,๐๐๐	๓๗	๒๓,๙๐๐,๐๐๐
ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๕๐	๑๒๐,๖๙๓,๒๐๖	๓๑	๒๕,๓๗๕,๙๘๖	๓๐	๒๙,๑๑๑,๑๘๓
ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๑๓	๙๖,๖๐๕,๘๐๐	๒๐	๔๐,๘๕๐,๐๐๐	๑๙	๙,๙๖๔,๐๐๐
ด้านการบริการสาธารณะ	๑๘๗	๖๘๓,๒๙๕,๕๓๐	๑๗๓	๔๑๓,๒๔๐,๗๐๐	๑๗๔	๔๕๗,๓๒๔,๕๕๐
รวม	๕๖๒	๑,๒๒๕,๘๐๓,๑๗๖	๓๕๑	๗๐๐,๗๖๑,๘๔๖	๓๔๖	๗๖๕,๕๗๓,๓๕๓

### การจัดทำงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีจำนวนโครงการและงบประมาณที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ และจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ ที่ดำเนินการทั้งหมด	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๘	๒,๔๗๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๐	๒๗,๖๕๗,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๑๔	๑,๘๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๑๓	๘,๒๘๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๕๙	๒๒,๙๘๖,๘๕๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๑๓๑	๖๔๖,๒๖๔,๕๐๐
รวม	๒๓๕	๗๐๙,๕๒๓,๓๕๐

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
- ๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
- ๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

## ๒. การกำหนดแนวทางวิธีการดำเนินการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคำแนะนำของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเลือกการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

### เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

๑. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)
๒. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๓. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๔. ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan)
๕. แบบรายงานตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### การประเมินผล

กำหนดเป้าหมายในการจัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนา ดังนี้

ประเด็นการประเมินผล	ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมาย	วิธีการประเมินผล
๑. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละของจำนวนแผนงาน / โครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ประจำปี ๒๕๕๙	ร้อยละ ๕๐	ตรวจสอบจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) (เฉพาะปี ๒๕๕๙) กับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๒. ความพึงพอใจของประชาชน	ร้อยละของความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปี	ร้อยละ ๘๐	สำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจากประชาชน / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



**๓. การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล**

ช่วงเวลาในการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ดังนี้

ครั้งที่ ๑ ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๒ ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙) ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ครั้งที่ ๓ ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน๒๕๕๙) ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๔ ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๙) สรุปรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

**ตารางแสดงระยะเวลาในการดำเนินการในการติดตามและประเมินผล  
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๕๙**

ไตรมาส ที่	ระยะเวลา / ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน														
	พ.ศ.๒๕๕๘			พ.ศ.๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑	←————→														
๒				←————→											
๓							←————→								
๔										←————→					

ครั้งที่	ระยะเวลาในการดำเนินการติดตามและประเมินผล														
	ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ														
	ต.ค. ๕๘	พ.ย. ๕๘	ธ.ค. ๕๘	ม.ค. ๕๙	ก.พ. ๕๙	มี.ค. ๕๙	เม.ย. ๕๙	พ.ค. ๕๙	มิ.ย. ๕๙	ก.ค. ๕๙	ส.ค. ๕๙	ก.ย. ๕๙	ต.ค. ๕๙	พ.ย. ๕๙	ธ.ค. ๕๙
ครั้งที่ ๑					←————→										
ครั้งที่ ๒							←————→								
ครั้งที่ ๓										←————→					
ครั้งที่ ๔													←————→		

บทที่ ๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตามแนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปีของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว


ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	

## บทที่ ๒

### กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ว่าได้มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้หรือไม่ มีการดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นการวัดความสำเร็จ / ความล้มเหลวของแผนพัฒนารวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ โดยได้ดำเนินการตามแนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏรายละเอียดดังนี้.

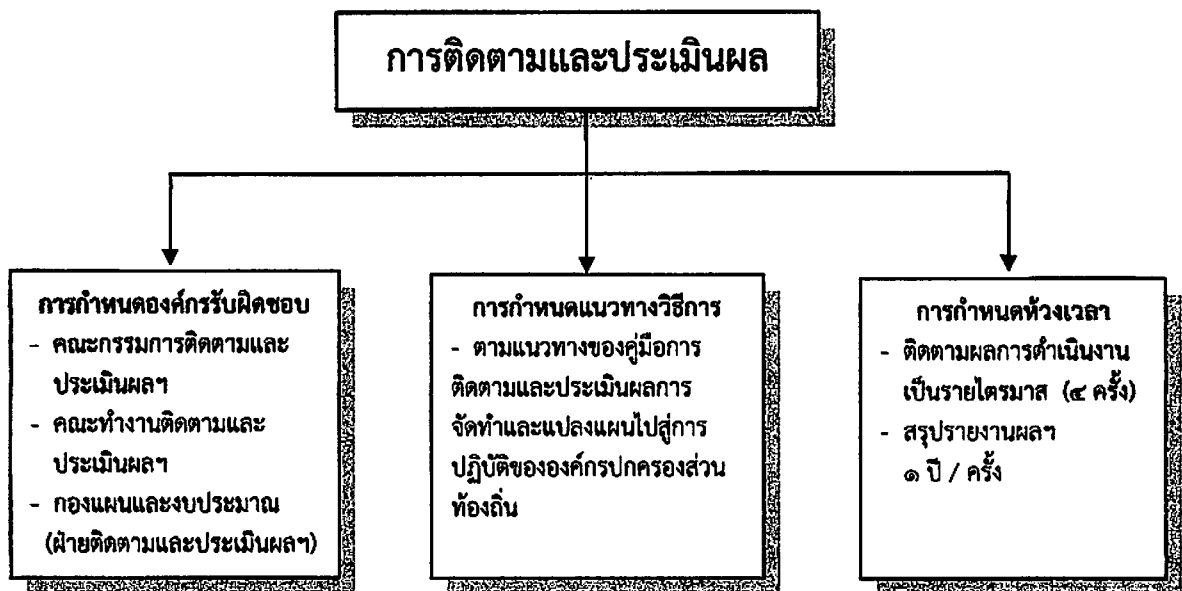

#### ๑. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ สองปี ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผล		
๒๐. มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อติดตามผล การดำเนินงานตามไตรมาส	✓	
๒๑. มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส	✓	
๒๒. มีการออกพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน	✓	
๒๓. มีการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ให้สภาท้องถิ่น, คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบ		
๒๔. มีการประชาสัมพันธ์และประกาศผลการติดตามและประเมินผล ให้ประชาชนทราบ		


สรุป : จากผลการติดตามและประเมินผลตนเอง มีการดำเนินการทั้งหมด ๒๒ ข้อ ซึ่งประเด็นการประเมินข้อที่ ๒๓ - ๒๔ จะมีการดำเนินงานภายหลังจากการประชุมการติดตามและประเมินผลไตรมาสที่ ๔

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)**

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙)		ปีที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐)		ปีที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑)		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๖๑	๗๘,๑๐๐,๐๐๐	๒๘	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๓๐	๓๕,๔๕๐,๐๐๐	๑๑๙	๑๒๖,๐๕๐,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๖๘	๑๕๘,๐๕๘,๖๔๐	๖๒	๑๕๓,๙๕๕,๑๖๐	๕๖	๑๖๙,๘๒๓,๖๓๐	๑๘๖	๔๗๑,๘๓๗,๔๓๐
๓. การพัฒนาด้านสังคม	๘๓	๘๙,๐๕๐,๐๐๐	๓๗	๒๖,๓๐๐,๐๐๐	๓๗	๒๓,๙๐๐,๐๐๐	๑๕๗	๑๓๙,๒๕๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๕๐	๑๒๐,๖๙๓,๒๐๓	๓๑	๒๕,๓๗๕,๙๘๖	๓๐	๒๙,๑๑๑,๑๘๓	๑๑๑	๑๗๕,๑๘๐,๓๗๕
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๑๓	๙๖,๖๐๕,๘๐๐	๒๐	๔๐,๘๕๐,๐๐๐	๑๙	๙,๙๖๔,๐๐๐	๑๕๒	๑๔๗,๔๑๙,๘๐๐
๖. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๑๘๗	๖๘๓,๒๙๕,๕๓๐	๑๗๓	๔๑๓,๒๔๐,๗๐๐	๑๗๔	๔๕๗,๓๒๔,๕๔๐	๕๓๔	๑,๕๕๓,๘๖๐,๗๗๐
<b>รวม</b>	<b>๕๖๖</b>	<b>๑,๒๒๕,๘๐๓,๑๗๖</b>	<b>๓๕๑</b>	<b>๗๐๐,๗๖๑,๘๔๖</b>	<b>๓๔๖</b>	<b>๗๒๕,๕๗๓,๓๕๓</b>	<b>๑,๒๕๓</b>	<b>๒,๖๕๒,๑๓๘,๓๗๕</b>

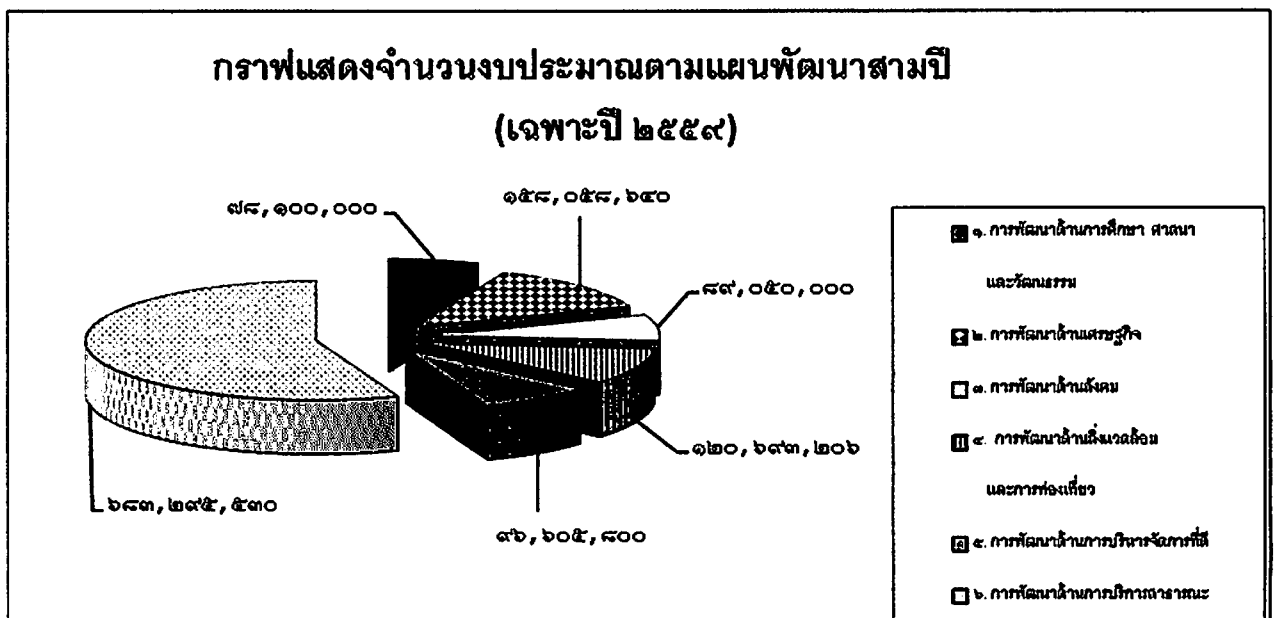

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๐	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบบถนนสายบ้านไร่เจ๊ก ม.๒ ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี	๒,๓๐๐,๐๐๐	๐		✓		กันเงิน
๔๑	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองหนองไผ่ ม.๔ ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี	๑,๙๗๗,๐๐๐	๑,๘๔๐,๐๐๐	✓			โอนลด ๑๓๐,๐๐๐
๔๒	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบบคลองหนองจอกกลาง ซอย ๑ ม.๖ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี	๙๗๙,๐๐๐	๐		✓		กันเงิน
๔๓	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายลำราง ม.๑ - ๓ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี	๑,๙๗๓,๐๐๐	๑,๘๕๐,๐๐๐	✓			โอนลด ๑๒๐,๐๐๐
๔๔	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองทางหลวง ม.๑ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี	๔,๙๘๘,๐๐๐	๔,๗๖๕,๐๐๐	✓			โอนลด ๒๒๐,๐๐๐
๔๕	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบางแก้ว ม.๑ ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี	๒,๓๓๑,๐๐๐	๒,๑๙๕,๐๐๐	✓			โอนลด ๑๓๐,๐๐๐
๔๖	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองท่าทราย ม.๑ ต.ศิระชะทอง อ.นครชัยศรี	๑,๙๖๘,๐๐๐	๐		✓		กันเงิน
๔๗	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง ม.๒ ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี	๑,๙๙๒,๐๐๐	๑,๘๖๕,๐๐๐	✓			โอนลด ๑๒๐,๐๐๐

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๒	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองวัฒนา ม.๕,๖ ต.บางกระทีก อ.สามพราน	๒,๙๘๑,๐๐๐	๐		✓		กันเงิน
๘๓	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง ม.๔ ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี	๕,๖๘๐,๐๐๐	๐		✓		กันเงิน
๘๔	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองใหม่ ม.๒ บ้านบางกระจัน ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี	๑,๔๙๓,๐๐๐	๐		✓		กันเงิน
๘๕	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองลัดท่ามอญ ม.๔ บ้านท่ามอญ ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี	๙๘๖,๐๐๐	๘๙๕,๐๐๐	✓			
๘๖	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายบางพระ - ห้วยพลู ม.๓ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี	๑,๓๘๖,๐๐๐	๐		✓		กันเงิน
๘๗	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองทางหลวง ม.๓ ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๘๑๘,๐๐๐	✓			โอนลด ๑๘๐,๐๐๐
๘๘	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองท่าเรือ - บางพระ ม.๑,๒ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี	๑,๔๙๓,๐๐๐	๐		✓		กันเงิน
๘๙	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองบ้านสวน กล้วย ม.๑ ต.จิวราย อ.นครชัยศรี	๙๗๐,๐๐๐	๘๘๕,๐๐๐	✓			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๔	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบบคลองบ้านท่าหน่อไม้ ม.๓ ต.ธรรมศาลา เชื่อมต่อ ต.สามควายเผือก อ.เมืองฯ	๑,๗๕๖,๐๐๐	๑,๖๗๕,๐๐๐	✓			โอนลด ๘๐,๐๐๐
๗๕	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.เลียบบถนน ม.๔ ต.ถนนขาด อ.เมืองฯ	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๑๘๑,๘๒๒	✓			โอนลด ๒๑๐,๐๐๐
๗๖	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองรางบัว ม.๓ ต.ดอนยายหอม เชื่อมต่อ ทต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ	๘๕๘,๐๐๐	๘๖๖,๐๐๐	✓			
๗๗	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองชัยพฤกษ์ ม.๖,๓ ต.ห้วยจรเข้ม อ.เมืองฯ	๑,๖๒๘,๐๐๐	๑,๕๒๕,๐๐๐	✓			
๗๘	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง ม.๖ ต.คลองจินดา อ.สามพราน	๒,๖๒๒,๐๐๐	๒,๕๓๘,๐๐๐	✓			โอนลด ๘๐,๐๐๐
๗๙	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองประสพสุข ม.๑ - ๕ ต.บางช้าง อ.สามพราน	๑,๗๘๒,๐๐๐	๑,๖๖๔,๐๐๐	✓			โอนลด ๑๑๐,๐๐๐
๘๐	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนน ม.๒ ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน	๑,๘๖๒,๐๐๐	๑,๘๔๘,๐๐๐	✓			โอนลด ๑๐,๐๐๐
๘๑	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลอง ม.๗ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน	๖๙๐,๐๐๐	๖๔๕,๐๐๐	✓			โอนลด ๔๐,๐๐๐



ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖๕	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สาย ม.๒ ต.ถนนขาด อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี	๑,๕๑๗,๕๐๐	๑,๐๖๗,๐๐๐	✓			โอนลด ๔๕๐,๐๐๐
๖๖	ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายเลียบบทางรถไฟ บ้านกระดีเดียว ม.๖ ต.หนองปากโลง เชื่อมต่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองฯ	๗,๒๕๖,๐๐๐	๗,๒๕๖,๐๐๐	✓			โอนลด ๑๐,๐๐๐
๖๗	ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองพระยาพายเรือ ม.๖ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ	๙๘๒,๐๐๐	๐		✓		กั้นเงิน
๖๘	ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองรางบัว ม.๓ ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ	๑,๐๖๔,๐๐๐	๐		✓		กั้นเงิน
๖๙	ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง ม.๓ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน	๒,๕๕๐,๐๐๐	๒,๒๔๔,๐๐๐	✓			โอนลด ๓๐๐,๐๐๐
๗๐	ก่อสร้างสะพานแขวน ข้ามแม่น้ำท่าจีน ม.๘ ต.บางเลน อ.บางเลน	๑๓,๔๘๕,๐๐๐	๐		✓		กั้นเงิน
๗๑	ค่าจ้างเหมาจัดทำงานวิศวกรรมจราจรทางบก	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๙๙๐,๐๐๐	✓			โอนลด ๑๐,๐๐๐
๗๒	ค่าจ้างเหมาจัดทำงานจราจรสงเคราะห์ โดยการติดตั้ง	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๒,๐๐๐,๐๐๐
๗๓	ค่าจ้างเหมาทำป้ายชื่อถนน และป้ายแนะนำสายทางสายทาง เช่น ป้ายหมู่บ้าน ป้ายบังคับ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๑,๐๐๐,๐๐๐

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๘	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๑๔ ต.ลำเหย อ.คอนตูม เชื่อมต่อ ม.๑๘ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน	๒,๙๘๒,๐๐๐	๒,๔๘๐,๐๐๐	✓			โอนลด ๕๐๐,๐๐๐
๕๙	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.๙ ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ม.๙ ต.บ้านยาง อ.เมือง	๓,๑๗๐,๐๐๐	๒,๗๑๗,๐๐๐	✓			โอนลด ๔๕๐,๐๐๐
๖๐	ก่อสร้างถนน คสล. สายสามควายเผือก - กกโก ม.๔ ต.สามควายเผือก อ.เมืองฯ พร้อมวางท่อระบายน้ำ	๑,๕๘๐,๐๐๐	๐		✓		กั้นเงิน
๖๑	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.๖ - ๑๐ ต.ทัพหลวง เชื่อมต่อ ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองฯ	๑,๔๒๒,๐๐๐	๐				โอนลด ๑,๔๒๒,๐๐๐ เนื่องจาก ทางหลวงชนบทดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว
๖๒	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.๕ ต.หนองปากโลง เชื่อมต่อ เขตทม.นครปฐม อ.เมืองฯ	๑,๐๕๒,๐๐๐	๙๕๗,๐๐๐	✓			โอนลด ๙๐,๐๐๐
๖๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายไวไว - โรงแป้ง ม.๕,๗ ต.ไร่ซิง เชื่อมต่อ ต.บางกระทีก อ.สามพราน	๒,๘๓๒,๐๐๐	๒,๔๕๐,๐๐๐	✓			
๖๔	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ม.๑ ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน	๑,๙๘๕,๐๐๐	๑,๙๘๓,๐๐๐	✓			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๑	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๓,๔ ต.วังตะกุง เชื่อมต่อ ม.๕ ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ	๒,๙๘๘,๐๐๐	๒,๕๙๕,๐๐๐	✓			โอนลด ๓๙๐,๐๐๐
๕๒	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายซอยเปโตร ๓ ม.๖ ต.ท่าข้าม เชื่อมต่อ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน	๒,๙๓๗,๐๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐	✓			โอนลด ๓๓๐,๐๐๐
๕๓	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๒ ต.ทุ่งขวาง เชื่อมต่อ ม.๔ ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน	๑,๗๓๙,๐๐๐	๑,๔๕๑,๐๐๐	✓			โอนลด ๒๘๐,๐๐๐
๕๔	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๑ ต.ทุ่งบัว เชื่อมต่อ ม.๑๑ ต.สระสีมูม อ.กำแพงแสน	๑,๔๘๖,๐๐๐	๑,๓๙๒,๐๐๐	✓			โอนลด ๙๐,๐๐๐
๕๕	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายทุ่งเจริญทอง ๓ ม.๘ ต.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ม.๗ ต.สระสีมูม และ ม.๒ ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน	๑,๙๑๑,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	✓			โอนลด ๒๖๐,๐๐๐
๕๖	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายบ้านหนองกระหิง ม.๕ ต.รางพิบูล เชื่อมต่อ ม.๑๐ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน	๑,๘๑๙,๐๐๐	๐		✓		โอนลด ๓๓๐,๐๐๐ กันเงิน ๑,๔๘๙,๐๐๐
๕๗	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายเศรษฐวิถึ ซอย ๖ ม.๔ ต.สามง่าม เชื่อมต่อ ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม	๑๔,๖๔๙,๐๐๐	๑๓,๗๗๔,๐๐๐	✓			โอนลด ๘๗๐,๐๐๐

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๔	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๖,๓ ต.รางพิบูล เชื่อมต่อกับ ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน	๓,๐๙๘,๐๐๐	๒,๙๗๐,๐๐๐	✓			โอนลด ๑๒๐,๐๐๐
๔๕	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายแยกต้นมะขาม - วังไม้แดง ม.๑๔ ต.วังน้ำเขียว เชื่อมต่อกับ ม.๑๐ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน	๒,๒๖๓,๐๐๐	๒,๑๑๔,๐๐๐	✓			โอนลด ๑๔๐,๐๐๐
๔๖	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๑๒,๔,๖ ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อกับ ม.๙ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน	๒,๖๘๑,๐๐๐	๒,๔๖๖,๐๐๐	✓			โอนลด ๒๑๐,๐๐๐
๔๗	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๒๐ ต.บางหลวง เชื่อมต่อกับ ม.๑ ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน	๒,๓๗๐,๐๐๐	๒,๒๘๕,๐๐๐	✓			โอนลด ๘๐,๐๐๐
๔๘	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๗ ต.ไทรงาม เชื่อมต่อกับ ต.นิลเพชร อ.บางเลน	๒,๕๔๔,๐๐๐	๒,๓๔๓,๐๐๐	✓			โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
๔๙	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายนครปฐม - ดอนตูม ม.๖ ต.บ่อพลับ เชื่อมต่อกับ ม.๗ ต.มาบแค อ.เมืองฯ	๑,๖๕๓,๐๐๐	๑,๓๘๕,๐๐๐	✓			โอนลด ๒๖๐,๐๐๐
๕๐	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๒,๑๐ ต.นครปฐม เชื่อมต่อกับ ต.บ่อพลับ อ.เมืองฯ	๑,๓๓๘,๐๐๐	๑,๐๘๘,๐๐๐	✓			โอนลด ๒๕๐,๐๐๐

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๗	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๑๕ ต.โพรงมะเดื่อ เชื่อมต่อ ต.หนองปากโลง อ.เมืองฯ	๒,๘๙๗,๐๐๐	๒,๔๘๔,๐๐๐	✓			โอนลด ๔๑๐,๐๐๐
๓๘	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายทุ่งกระพังโหม ๑ ม.๘ ต.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ม.๙ ต.สระสีมูม อ.กำแพงแสน	๑,๖๑๙,๐๐๐	๑,๔๒๔,๐๐๐	✓			
๓๙	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายทุ่งประดู่ ม.๓ ต.รางพิบูลย์ เชื่อมต่อ ม.๗ ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน	๒,๒๕๖,๐๐๐	๒,๐๔๘,๐๐๐	✓			โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
๔๐	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายเลียบบคลองชลประทาน ม.๑๑ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม	๖,๔๔๑,๐๐๐	๕,๙๗๔,๐๐๐	✓			โอนลด ๔๖๐,๐๐๐
๔๑	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายบ้านดอนซาก - บ้านโพระดาบ ม.๒๑ ต.ทุ่งลูกนก เชื่อมต่อ ม.๕ ต.รางพิบูลย์ อ.กำแพงแสน	๑,๔๙๐,๐๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐	✓			โอนลด ๒๔๐,๐๐๐
๔๒	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายเอกชัย ๒ ม.๑๒ ต.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ม.๙ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน	๑,๔๐๗,๐๐๐	๑,๒๔๒,๐๐๐	✓			
๔๓	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๕ ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ม.๕ ต.รางพิบูลย์ อ.กำแพงแสน	๑,๔๗๓,๐๐๐	๑,๓๒๘,๐๐๐	✓			โอนลด ๑๔๐,๐๐๐

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๒	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกฯ สายคัน คลองชลประทาน สาย ๑ ซ้าย ๘ ขวา ๕ ซ้าย ม.๒ ต.สนามจันทร์ เชื่อมต่อ ต.ห้วยจรเข้ม อ.เมืองฯ	๑๖,๐๖๑,๐๐๐	๐		✓		กั้นเงิน
๓๓	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สาย ม.๗,๑๑ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ม.๙ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม	๖,๙๑๘,๐๐๐	๐		✓		กั้นเงิน
๓๔	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สาย ม.๖ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน	๑,๙๙๗,๐๐๐	๐		✓		กั้นเงิน
๓๕	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายเลียบบคลองชลประทาน ๒ ขวา ๘ ขวา ๕ ซ้าย ม.๘ (ฝั่งขวา) ต.ลำพญา เชื่อมต่อกับ ต.หนองดินแดง และ ต.บางแฉม อ.เมืองฯ	๓,๕๗๑,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	✓			โอนลด ๒๗๐,๐๐๐
๓๖	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๖ ต.บ้านยาง เชื่อมต่อกับ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองฯ	๑,๕๙๗,๐๐๐	๑,๓๗๒,๐๐๐	✓			โอนลด ๒๒๐,๐๐๐

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดต่างๆ ถนน อบจ.นฐ.๐๐๔๓ บ้านดอนเฝ้า-บ้านกำแพงแสน ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน	๑๙,๕๐๓,๐๐๐	๐		✓		กั้นเงิน
๒๗	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดต่างๆ ถนน อบจ.นฐ.๐๐๑๗ ค่ายลูกเสือ-กำแพงแสน ต.ทุ่งกระพังโหม, ต.ทุ่งขวาง, ต.ห้วยหมอนทอง, ต.รางพิบูล อ.กำแพงแสน	๑๑,๗๙๓,๐๐๐	๐		✓		กั้นเงิน
๒๘	ปรับปรุงสะพาน คสล.ข้ามคลองชลประทาน ๘ ขวา ๕ ซ้าย ม.๗ ต.หนองปากโลง อ.เมืองฯ	๖๓๑,๐๐๐	๐		✓		กั้นเงิน
๒๙	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกฯ สาย ม.๑,๓,๔,๕,๖ ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อ ต.บางระกำ, ต.ลำพญา อ.บางเลน	๒๓,๙๙๖,๐๐๐	๐		✓		กั้นเงิน
๓๐	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกฯ สาย คลองทางหลวง ม.๑ ต.โคกพระเจดีย์ เชื่อมต่อ ต.ท่ากระชับ, ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี	๒๐,๕๐๐,๐๐๐	๐		✓		กั้นเงิน
๓๑	ปรับปรุงถนน คสล.สาย ม.๓ ต.ห้วยจรเข้ม เชื่อมต่อ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองฯ	๔,๙๐๖,๐๐๐	๐		✓		กั้นเงิน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๘	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ ถนน อบจ.นฐ.๐๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ - บ้านหนองงูเห่าล้อม ต.ทัพหลวง, ต.หนองงูเห่าล้อม อ.เมืองฯ	๙,๒๑๗,๐๐๐	๙,๑๗๗,๐๐๐	✓			
๑๙	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ ถนน อบจ.นฐ.๐๐๒๐ บ้านทัพหลวง - บ้านหนองงูเห่าล้อม ต.หนองงูเห่าล้อม อ.เมืองฯ	๗,๖๑๖,๐๐๐	๗,๕๘๐,๐๐๐	✓			
๒๐	ปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงกันดิน คสล.เลียบบคลอง ชัยพฤกษ์ ม.๕ ต.สนามจันทร์ อ.เมืองฯ	๓๐๗,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	✓			
๒๑	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สายไผ่คอกแก้ว ม.๑๑ ต.บางเลน เชื่อมต่อ ม.๘ ต.ดอนตูม อ.บางเลน	๑๔,๕๘๑,๐๐๐	๑๔,๔๖๐,๐๐๐	✓			
๒๒	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สายโรมัน - ดงเกตู ต.สามพราน เชื่อมต่อ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน	๕,๗๖๙,๐๐๐	๐		✓		กั้นเงิน
๒๓	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สาย ม.๓,๑๔ ต.วังน้ำเขียว เชื่อมต่อ เทศบาล ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน	๑๑,๐๓๗,๐๐๐	๐		✓		กั้นเงิน
๒๔	ปรับปรุงถนน คสล. ม.๑ ต.ถนนขาด อ.เมืองฯ	๒,๙๓๕,๐๐๐	๐		✓		กั้นเงิน
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.๔ ต.ถนนขาด อ.เมืองฯ	๔,๖๗๗,๐๐๐	๐		✓		กั้นเงิน



ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สายเลียบบคลอง ชลประทาน สาย ๒ ม.๙ ต.หินมูล เชื่อมต่อ ต.บางหลวง อ.บางเลน	๒๐,๖๗๐,๐๐๐	๐		✓		กั้นเงิน
๑๓	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สาย ม.๔ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อ ต.คลองจินดา อ.สามพราน, ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ	๒๓,๒๓๔,๐๐๐	๒๓,๑๑๐,๐๐๐	✓			
๑๔	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สายสะแกทราย- วัดตากแดด ต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ	๓,๔๒๗,๐๐๐	๒,๙๕๐,๐๐๐	✓			
๑๕	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สาย ม.๑ ต.ทุ่งน้อย เชื่อมต่อ ต.มาบแค ต.ตาก้อง อ.เมืองฯ	๗,๔๑๕,๐๐๐	๗,๐๒๐,๐๐๐	✓			
๑๖	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สาย ม.๘ ต.ลำพญา เชื่อมต่อ ต.หนองดินแดง อ.เมืองฯ	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓			
๑๗	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สายเลียบบคลอง บางปลากาย ม.๕ ต.วังเย็น เชื่อมต่อ ม.๘ ต.หนองดินแดง อ.เมืองฯ	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	✓			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สาย ม.๑๔,๑ ต.สระกระเทียม เชื่อมต่อ ต.สวนป่า, ต.หนองดินแดง อ.เมืองฯ	๕,๙๙๓,๐๐๐	๕,๙๓๐,๐๐๐	✓			
๗	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ ม.๑๐,๑๑ ต.มาบแค เชื่อมต่อ ต.ตาก้อง อ.เมืองฯ	๓,๕๙๙,๐๐๐	๓,๕๖๐,๐๐๐	✓			
๘	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สาย ม.๑ ต.ทุ่งบัว เชื่อมต่อกับ ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน	๗,๕๓๙,๐๐๐	๓,๔๖๕,๐๐๐	✓			
๙	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สาย ม.๑ ต.หนองดินแดง เชื่อมต่อกับ ต.สระกระเทียม, ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองฯ	๕,๕๕๖,๐๐๐	๕,๕๒๐,๐๐๐	✓			
๑๐	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ ถนน อบจ. นฐ.๐๐๕๖ แยก ทล.๔ (กม.ที่ ๖๒.๐๐๐) - บ้านเกาะจาน ต.วังเย็น, ต.หนองดินแดง อ.เมืองฯ	๒๗,๘๗๔,๐๐๐	๒๖,๖๕๐,๐๐๐	✓			
๑๑	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สาย ม.๕ ต.นครปฐม เชื่อมต่อกับ เขต ทน.นครปฐม อ.เมืองฯ	๗,๗๙๗,๐๐๐	๗,๔๗๒,๐๐๐	✓			

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สาย ม.๑,๒,๘ ต.แหลมบัว เชื่อมต่อ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี	๒๒,๗๐๒,๐๐๐	๒๑,๗๗๕,๐๐๐	✓			
๒	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๓๔ บ้านบางระกำ - บ้านหลวง ต.บางระกำ, ต.ดอนพุทรา, อ.ดอนตูม, ต.บ้านหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม	๑๑,๖๐๖,๐๐๐	๑๑,๓๐๐,๐๐๐	✓			
๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.๕ ต.สามพราน เชื่อมต่อ ต.ท่าข้าม อ.สามพราน	๒,๔๙๗,๐๐๐	๒,๔๕๐,๐๐๐	✓			
๔	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๕๐ บ้านแหลมชะอู๋ ม.๑๑ - บ้านคลองพระมอพิสัย ม.๘ ต.ลำพญา ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน	๖,๘๖๐,๐๐๐	๖,๗๙๒,๐๐๐	✓			
๕	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางฯ สาย ม.๑๑ ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน	๓,๕๒๒,๐๐๐	๓,๔๘๐,๐๐๐	✓			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณภายในสำนักงานอบจ.นฐ.	๖๐๐,๐๐๐	๐		✓		กั้นเงิน
๕๖	ค่าปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บเอกสาร บริเวณศูนย์ บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ต.พระประโทน อ.เมืองฯ	๖๕๐,๐๐๐	๖๐๓,๐๐๐	✓			
๕๗	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดใต้น้ำ ขนาด ๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด		๘๒,๐๐๐	✓			โอนเพิ่ม ๘๒,๐๐๐
๕๘	ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิดฯ สถานสงเคราะห์ คนชรานครปฐม		๓๕๐,๐๐๐	✓			โอนเพิ่ม ๓๕๐,๐๐๐
๕๙	ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิดฯ สถานสงเคราะห์ คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ		๓๕๐,๐๐๐	✓			โอนเพิ่ม ๓๕๐,๐๐๐

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔๖	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง)	๒๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	✓			
๔๗	ค่าจัดทำประกันภัยราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	๑๐๐,๐๐๐	๔๕,๕๖๖.๗๘	✓			โอนลด ๕๐,๐๐๐
๔๘	ก่อสร้างห้องสุขา	๖๐๐,๐๐๐	๕๘๗,๐๐๐	✓			
๔๙	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.นฐ. ต.บางแพม อ.เมืองฯ	๓,๒๐๐,๐๐๐	๐		✓		กันเงินไม่ก่อนนี้
๕๐	ก่อสร้างรั้วลวดหนาม บริเวณตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตร อบจ.นฐ. ต.ไทยवास อ.นครชัยศรี	๒๕๐,๐๐๐	๐		✓		กันเงินไม่ก่อนนี้
๕๑	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.นฐ. ต.บางแพม อ.เมืองฯ	๙๐๐,๐๐๐	๐		✓		กันเงิน
๕๒	ก่อสร้างที่จอดรถ บริเวณศูนย์บรรเทาสาธารณภัย อบจ.นฐ. ต.พระประโทน อ.เมืองฯ	๑,๗๐๐,๐๐๐	๐		✓		กันเงิน
๕๓	ค่าติดตั้งระบบประปา บริเวณศูนย์บรรเทาสาธารณภัย อบจ.นฐ. ต.พระประโทน อ.เมืองฯ	๘๐,๐๐๐	๐		✓		กันเงินไม่ก่อนนี้
๕๔	ก่อสร้างห้องสุขา บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ม.๑ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี	๑,๕๐๐,๐๐๐	๐		✓		กันเงิน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๗	จัดซื้อโทรศัพท์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองพัสดุฯ)	๓,๐๐๐	๒,๘๐๐	✓			
๓๘	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (กองพัสดุฯ)	๕๐,๐๐๐	๔๖,๖๙๐	✓			
๓๙	จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัดฯ)	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๕๗๗,๐๐๐	✓			โอนลด ๒๓,๐๐๐
๔๐	ค่าปรับปรุงตัดแปลงรถยนต์ตู้ สำหรับขนย้ายผู้ป่วย ไปโรงพยาบาล (สำนักปลัดฯ)	๔๑๐,๐๐๐	๓๙๐,๕๕๐	✓			โอนลด ๑๙,๔๕๐
๔๑	จัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย (รถดั้มพ์) จำนวน ๑ คัน (กองช่าง)	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐	✓			โอนลด ๓๐๐,๐๐๐
๔๒	จัดซื้อรถยนต์แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน (กองช่าง)	๗๘๗,๐๐๐	๖๓๕,๐๐๐	✓			โอนลด ๗๐,๐๐๐
๔๓	จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิกตีบตะขาบ ชนิดแขนยาว จำนวน ๑ คัน (กองช่าง)	๕,๙๕๐,๐๐๐	๕,๘๕๐,๐๐๐	✓			โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๔๔	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง)	๑๙,๐๐๐	๑๗,๗๐๐	✓			
๔๕	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง)	๒๖,๐๐๐	๐				โอนลด ๒๖,๐๐๐ ราคาท้องตลาดสูงกว่าที่ตั้งไว้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๘	จัดซื้อเก้าอี้นั่งสำหรับรับแขกแบบ ๔ ที่นั่ง จำนวน ๔ ชุด (กองกิจการสภาฯ)	๒๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๒๐,๐๐๐ เนื่องจากวัตถุประสงค์ ของการใช้งานและความเหมาะสมเปลี่ยนแปลงไปจึงไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ
๒๙	จัดซื้อกล่องบันทึกวีดีโอ จำนวน ๑ ชุด (กองกิจการสภาฯ)	๕๕,๐๐๐	๕๙,๙๐๐	✓			
๓๐	จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร (กองกิจการสภาฯ)	๒๙,๐๐๐	๒๖,๗๕๐	✓			
๓๑	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว (กองแผนฯ)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			
๓๒	จัดซื้อรถเข็น ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (กองแผนฯ)	๕,๐๐๐	๒,๓๐๐	✓			
๓๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (กองแผนฯ)	๕๐,๐๐๐	๔๒,๙๕๐	✓			
๓๔	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด (กองช่างฯ)	๑๐๐,๐๐๐	๘๒,๕๐๐	✓			
๓๕	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (หน่วยตรวจสอบฯ)	๕๐,๐๐๐	๔๒,๙๕๐	✓			
๓๖	จัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ ตัว (กองพัสดุฯ)	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	✓			

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๗	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัว (สำนักปลัดฯ)	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓			
๑๘	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๕ ตัว (สำนักปลัดฯ)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓			
๑๙	จัดซื้อรถเข็น ๔ ล้อ (สำนักปลัดฯ)	๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			
๒๐	จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา เข้าออกงาน จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัดฯ)	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๙๐	✓			
๒๑	จัดซื้อแท่นโพลีเอทิลีน ชนิดทำด้วยไม้และสแตนเลส จำนวน ๑ ตัว (สำนักปลัดฯ)	๒๐,๐๐๐	๑๓,๘๐๓	✓			
๒๒	จัดซื้อกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด รวม ๑๓ จุด พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัดฯ)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๒๙๙	✓			
๒๓	จัดซื้อกล้องวงจรปิดระบบอนาล็อก (สำนักปลัดฯ)	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๘๖๙.๗๐	✓			
๒๔	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล (สำนักปลัดฯ)	๖๐,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	✓			
๒๕	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมสารกรองระบบ RO (สำนักปลัดฯ)	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	✓			
๒๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ (สำนักปลัดฯ)	๕๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	✓			
๒๗	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด (กองกิจการสภาฯ)	๙,๙๐๐	๐			✓	ราคาท้องตลาดสูงกว่าราคาที่ตั้งไว้



ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตย และการเลือกตั้งฯ	๓๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๓๐๐,๐๐๐ เนื่องจาก ไม่มีการเลือกตั้ง
๘	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย (Clinic Center)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๑,๐๐๐,๐๐๐ เนื่องจากไม่มี โครงการ
๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม และการจัด เวทีประชาคม	๔๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๕๙๙	✓			โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
๑๐	ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๗๔๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			โอนลด ๗๔๐,๐๐๐
๑๑	ค่าจ้างที่ปรึกษาทำการวิจัยเชิงสำรวจ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐		✓		กักเงิน
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของนายกฯ รองนายกฯ ข้าราชการฯลฯ ของ อบจ.นฐ.	๕๐๐,๐๐๐	๑๗๑,๕๐๖	✓			โอนลด ๓๐๕,๐๐๐
๑๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของ อบจ.นฐ.	๓,๒๕๐,๐๐๐	๗๖,๙๕๐	✓			โอนลด ๓,๑๗๐,๐๐๐
๑๔	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงานของข้าราชการ อบจ.นฐ.	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	✓			โอนลด ๑,๖๓๐,๐๐๐
๑๕	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน ของสมาชิกสภาฯ อบจ.นฐ.	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๑,๐๐๐,๐๐๐ เนื่องจากไม่ได้ จัดทำโครงการ
๑๖	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๕ ตัว (สำนักปลัดฯ)	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	✓			

**รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙**

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแทนตำแหน่งที่ว่าง	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ หรือนายก อบจ. แทนตำแหน่งที่ว่าง	๘,๐๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๘,๐๐๐,๐๐๐ เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง
๓	ค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ หรือนายก อบจ.นฐ.	๑๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๑๐,๐๐๐ เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง
๔	ค่าน้ำประปา ซึ่งใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ หรือนายก อบจ.	๑๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๑๐,๐๐๐ เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง
๕	ค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ หรือนายก อบจ.นฐ.	๓๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๓๐,๐๐๐ เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง
๖	ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา ฯลฯ ใช้เลือกตั้งสมาชิกสภาฯ หรือนายก อบจ.นฐ.	๒,๔๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๒,๔๐๐,๐๐๐ เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	ขุดลอกคลองลำท่าข่อย ม.๒ ต.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี	๑,๖๒๕,๐๐๐	๑,๑๒๐,๐๐๐	✓			
๘	ขุดลอกคลองลำยายใหญ่ ม.๓,๔,๕ ต.คอนยายหอม เชื่อมต่อ ต.ถนนขาด อ.เมืองฯ	๑,๗๘๔,๐๐๐	๑,๓๐๔,๒๕๐	✓			
๙	ขุดลอกคลองท่าเรือ - บาพระ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน	๒,๔๒๑,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	✓			
๑๐	ขุดลอกคลองบางน้อย ม.๑๐,๑๑,๑๒,๒๑ ต.บางหลวง อ.บางเลน เชื่อมต่อ ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน	๒,๗๓๙,๐๐๐	๒,๖๒๓,๐๐๐	✓			
๑๑	ขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ ม.๗,๑๐ ต.บางหลวง เชื่อมต่อ ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓			
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และข่าวสารของทางราชการการจัดพิมพ์วารสาร เผยแพร่ผลงานกิจกรรมของ อบจ.นฐ.	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓๗๐,๑๗๐	✓			โอนลด ๑,๖๐๐,๐๐๐
๑๓	สนับสนุนการท่องเที่ยวการส่งเสริมการตลาด และจำหน่ายสินค้าให้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจภาคเอกชนและเกษตรกร จ.นครปฐม ประจำปี ๒๕๕๙		๒๖,๐๐๐	✓			โอนเพิ่ม ๒๖,๐๐๐

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม	๕๐๐,๐๐๐	๒,๙๕๐	✓			โอนลด ๔๙๐,๐๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝก	๑๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ เนื่องจากไม่มีกล้าพันธุ์จึงไม่ได้จัดทำโครงการ
๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการปล่อยปลาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ เนื่องจากจัดทำโครงการอื่นทดแทนโดยมีการปล่อยปลาร่วมด้วย
๔	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งอุบัติเหตุของ อบจ.นฐ.	๒๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ เนื่องจากไม่ได้จัดทำโครงการ
๕	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน และพื้นที่ อบจ.นครปฐม	๖,๐๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๖,๐๐๐,๐๐๐ เนื่องจากไม่ได้จัดทำโครงการ
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙		๑๒๒,๗๗๐	✓			โอนลด ๒๐,๐๐๐

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	ค่าจัดซื้อแผ่นทดสอบน้ำตาลปลายนิ้ว จำนวน ๑,๐๓๖ ชุด และเข็มเจาะเลือดแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๑,๐๓๖ ชุด ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๒,๐๐๐,๐๐๐ เนื่องจากได้มีการกันเงินจากงบปี ๕๘ เพื่อจัดซื้อในปี ๕๙ เรียบร้อยแล้ว
๘	ค่าจัดซื้อชุดคัดกรองโรค จำนวน ๕๑๘ ชุด ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๕,๐๐๐,๐๐๐ เนื่องจากไม่ได้รับการร้องขอจากสาธารณสุขจังหวัดฯ
๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อบจ.นฐ. (ศพส.อบจ.)	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๘,๕๐๐	✓			โอนลด ๔,๙๖๐,๐๐๐
๑๐	ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากการเป็นพลเมืองดี ผู้ยากไร้ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ เนื่องจากไม่ได้รับการร้องขอ
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคนพิการหรือผู้ทำการจัดกลุ่มคนพิการต่าง ๆ ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ เนื่องจากไม่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ จ.นครปฐม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			โอนลด ๙๗๐,๐๐๐
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๕๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๑๕๐,๐๐๐ เนื่องจากไม่มีการจัดการฝึกอบรม
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย ในจังหวัดนครปฐม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐			✓	กันเงินไว้ในปีนี้เนื่องจากไม่มีผู้ประสบอุบัติเหตุ

รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ภายในเขตจังหวัดนครปฐม	๕๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ เนื่องจากไม่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานในจังหวัดฯ
๒	จัดหาวัสดุกีฬา อุปกรณ์การกีฬาต่างๆ ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ จำนวน ๕ กลุ่มโรงเรียน	๕๐๐,๐๐๐	๓๔๑,๕๐๑	✓			โอนลด ๑๒๐,๐๐๐
๓	จัดซื้อวัสดุกีฬาต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล เสื้อกีฬา ถ้วยรางวัล ฯลฯ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกาย ภายในจังหวัดนครปฐม	๕๐๐,๐๐๐	๗,๔๐๐	✓			โอนลด ๔๙๐,๐๐๐
๔	ค่าจัดซื้อวัสดุหรือสารเคมีในการป้องกันโรคระบาดที่มีอยู่เป็นพาหะเพื่อใช้ในการป้องกันโรคระบาดต่างๆ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เนื่องจากได้มีการจัดซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว
๕	ค่าใช้จ่ายในการอบรมการใช้ชุดคัดกรองโรคให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	๕๗๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๕๗๐,๐๐๐ เนื่องจากไม่ได้จัดซื้อชุดกรองโรคทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาของสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓๕๘,๖๐๐	✓			โอนลด ๖๐๐,๐๐๐

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๘ ต.นราภิรมย์ เชื่อมต่อกับ ม.๑๓ ต.บางภาษี อ.บางเลน	๒,๙๑๖,๐๐๐	๒,๕๙๐,๐๐๐	✓			โอนลด ๓๒๐,๐๐๐
๗	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายเลียบบคลองคูเมือง ม.๒ ต.ไผ่หูช้าง เชื่อมต่อกับ ม.๑๑ ต.หินมูล อ.บางเลน	๓,๕๑๗,๐๐๐	๓,๓๙๔,๐๐๐	✓			โอนลด ๑๒๐,๐๐๐
๘	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายวัดแหลมมะเกลือ ม.๑๒ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อกับ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน	๒,๙๔๒,๐๐๐	๒,๖๘๕,๐๐๐	✓			โอนลด ๒๕๐,๐๐๐
๙	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๙ ต.มาบแค เชื่อมต่อกับ ต.นครปฐม อ.เมืองฯ	๑,๔๙๙,๐๐๐	๑,๒๓๑,๐๐๐	✓			โอนลด ๒๖๐,๐๐๐
๑๐	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายคันบึง - วังน้ำขาว ม.๑ - ๕ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อกับ อ.สามพราน	๙,๙๗๕,๐๐๐	๙,๒๒๕,๐๐๐	✓			โอนลด ๗๕๐,๐๐๐

**รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙**

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า (OTOP)	๕๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ เนื่องจาก มีการแสดงสินค้าที่จำหน่ายในศูนย์ OTOP อยู่แล้ว
๒	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๓ ต.คลองใหม่ เชื่อมต่อ ต.บางช้าง อ.สามพราน	๒,๓๒๗,๐๐๐	๒,๐๗๕,๐๐๐	✓			โอนลด ๒๕๐,๐๐๐
๓	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายตลาดจินดาประชาร่วมใจ ม.๑ ต.ตลาดจินดา เชื่อมต่อ ม.๖ ต.คลองจินดา อ.สามพราน	๑,๑๘๗,๐๐๐	๑,๐๓๓,๐๐๐	✓			
๔	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายเลียบบคลองท่าสาร - บางปลา ม.๑ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ม.๑๒ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม	๒,๘๒๗,๐๐๐	๒,๕๘๖,๐๐๐	✓			โอนลด ๒๔๐,๐๐๐
๕	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายเลียบบคลองชลประทาน ๑๑ ซ้าย ๒ ซ้าย (ฝั่งขวา) ม.๘ ต.ห้วยม่วง เชื่อมต่อ ต.กระต๊อบ อ.กำแพงแสน	๒,๙๖๗,๐๐๐	๒,๖๔๐,๐๐๐	✓			โอนลด ๓๒๐,๐๐๐



**รายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา งานสานพิธี งานราชพิธี งานรัฐพิธี	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๓,๗๔๔	✓			
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้าย ตราสัญลักษณ์ราชวงศ์ และตราสัญลักษณ์ต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ เนื่องจาก ไม่ได้เบิกจ่ายจากรายการนี้แต่ทำการเบิกจ่ายจากประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๒๕,๙๑๐	✓			โอนลด ๙๗๐,๐๐๐
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึกมหารัชมงคล จ.นครปฐม	๒๐๐,๐๐๐	๐				โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ เนื่องจาก ไม่ได้รับการร้องขอให้ดำเนินการจากจังหวัดฯ
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมดนตรีในเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	-	๓๕,๐๐๐	✓			โอนเพิ่ม ๓๕,๐๐๐
๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชุมชนต้นแบบแห่งความดี	-	๒๐๐,๐๐๐	✓			โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐
๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๐๓,๕๐๐	✓			โอนลด ๗๙๐,๐๐๐
๘	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนใน จ.นครปฐม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๘๐๐	✓			โอนลด ๕๐๐,๐๐๐



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ ๕๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ไปแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และเป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดังนี้

- |                     |                                 |   |
|---------------------|---------------------------------|---|
| ๑.นายทองทิม ราชวงศ์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ                   | ประธานคณะกรรมการ  |
| ๒.นางนิลุบล เดชเกตุ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | รักษาราชการแทน<br>ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ<br>กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอนุสรณ์ บุญกวิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน  
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่  
เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายอนุสรณ์ บุญกวิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ที่ ๗๓๖ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มีคำสั่ง ที่ ๕๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นั้น


เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับเดิม) ทำให้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเปลี่ยนแปลงไป

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอยกเลิกคำสั่งฯ ที่ ๕๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดังต่อไปนี้

- |                                      |                                    |         |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------|
| ๑. นายชัชวาล บุญอำไพ                 | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ | กรรมการ |
| ๒. นายธนพันธ์ โชคดีรังสุข            | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ | กรรมการ |
| ๓. นายปัญญา บุญวงศ์                  | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ | กรรมการ |
| ๔. นางนงนุช บุญมาเลิศ                | ผู้แทนประชาคมจังหวัด               | กรรมการ |
| ๕. นายเกรียงวิทย์ วิริยะหิรัญไพบูลย์ | ผู้แทนประชาคมจังหวัด               | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม      | ผู้แทนภาคราชการ                    | กรรมการ |
| ๗. ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม             | ผู้แทนภาคราชการ                    | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ      |                                    | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองช่าง                |                                    | กรรมการ |
| ๑๐. นายทองทิม ราชวงศ์                | ผู้ทรงคุณวุฒิ                      | กรรมการ |
| ๑๑. นายศุภลักษณ์ ดิเยาว์             | ผู้ทรงคุณวุฒิ                      | กรรมการ |

/ให้คณะกรรมการ...

ԱՆԴՆՄԱՆԻ



๓.๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในการประชุมควรมีเอกสารเพิ่มเติมในเรื่องรายละเอียดโครงการและงบประมาณประกอบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เพื่อได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ โดยเสนอในรูปของเอกสารหรือการทำ Power Point

๓.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อในประชาชนและบุคคลทั่วไปได้รับทราบผลการดำเนินงาน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๕ ของงบประมาณ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สามารถตอบสนองภารกิจในด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๑ ของงบประมาณ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สามารถตอบสนองภารกิจในด้านการบริหารจัดการที่ดีได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๘ ของงบประมาณ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมภารกิจในด้านบริการสาธารณะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากได้มีการกันเงินตามโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางฯ ถนนคสล. ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ และงบประมาณที่เหลือจ่ายจากที่ดำเนินการแล้วมาตั้งจ่ายเป็นรายการให้ทำให้เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาของปีงบประมาณ

### ๓. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในคราวประชุม ดังนี้

๓.๑ ปัญหาผักตบชวาบริเวณแม่น้ำท่าจีนนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการแล้วควรมีการปลูกจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นในการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง เพื่อตอบสนองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๓.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมควรเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

๓.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมควรให้ความสำคัญกับโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นอกเหนือจากยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ เพราะเมื่อเทียบจำนวนโครงการกับยุทธศาสตร์ด้านอื่นแล้วจะมีโครงการที่ดำเนินการ น้อยมาก

๓.๔ จำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีมีจำนวนมากเกินไปไม่สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด

## บทที่ ๔ สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การติดตามและประเมินผลเป็นขั้นตอนหนึ่งของการวางแผน ที่มีความสำคัญเพราะการติดตามและประเมินผลจะเป็นตัวชี้วัดและบอกให้ผู้วางแผน ผู้ปฏิบัติตามแผน ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ทราบว่าแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้และนำไปปฏิบัติ ซึ่งเสียทั้งเวลา กำลังแรงงานและงบประมาณ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วได้ผลออกมาเป็นอย่างไร บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด และสามารถนำผลการประเมินมาตัดสินใจว่าจะดำเนินการตามแผนงาน / โครงการนี้ต่อไปหรือไม่

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ โดยได้ดำเนินการตามแนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้.

### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๕๙ สรุปได้ดังนี้

- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕๖๒ โครงการ  
จำนวนโครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๒๓๕ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๑
- จำนวนเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๒๕,๘๐๓,๑๗๖ บาท  
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗๐๙,๕๒๓,๓๕๐ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๘

### ๒. สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ได้แก่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๓ ของงบประมาณ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สามารถตอบสนองภารกิจในด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้ตามเป้าหมายที่กำหนด


๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๘ ของงบประมาณ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สามารถตอบสนองภารกิจในด้านเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมายที่กำหนด


๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๒ ของงบประมาณ ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมภารกิจในด้านสังคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากได้มีการกันเงินในเรื่องค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัยในจังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับกับเหตุที่จะเกิดขึ้น





๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙


  
..... ประธาน  
(นายทองทิม ราชวงศ์)  
ผู้ทรงคุณวุฒิ


  
..... กรรมการ  
(นางสาวอนงค์ โตโพธิ์ไทย)  
ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม


  
..... กรรมการ  
(นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง)  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม


  
..... กรรมการ  
(นายชัชวาล บุญอำไพ)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม


  
..... กรรมการ  
(นายธนพันธ์ โชคดีรังสุข)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม


  
..... กรรมการ  
(นายบัญชา บุญวงษ์)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

  
..... กรรมการ  
(นายสุกัลักษณ์ ดิยาว)  
ผู้ทรงคุณวุฒิ

  
..... กรรมการ  
(นายเกรียงวิทย์ วีริยะหิรัญไพบูลย์)  
ผู้แทนประชาคมจังหวัด

  
..... กรรมการ  
(นางนงนุช บุญมาเลิศ)  
ผู้แทนประชาคมจังหวัด

  
..... กรรมการ  
(นายสิทธิศักดิ์ ทรัพย์วุฒิเลิศ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
..... กรรมการ/เลขานุการ  
(นางนิลubl เดชเกต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

**๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙**

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
๑. ก่อสร้างคันกำแพงดิน คสล. สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร	✓			๘๗๙,๐๐๐	๗๓๙,๐๐๐
๒. ก่อสร้างโรงจอดรถ สถานสงเคราะห์ คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อบึง อุปถัมภ์) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร	✓			๓๒๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐
<b>รวม</b>				<b>๑,๒๐๘,๐๐๐</b>	<b>๙๗๘,๐๐๐</b>

หมายเหตุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เหลือจ่ายได้ส่งคืนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ  
เป็นเงิน ๒๓๙,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว

**๗. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน**

๑. โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
ได้กันเงินไว้เพื่อเบิกจ่ายในปีต่อไป โดยการกันเงินจะมีในส่วนของอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด และ  
อำนาจสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๒. โครงการที่เข้าช้อนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องมีการยกเลิกเนื่องจากท้องถิ่นได้รับ  
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ จึงทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ได้ดำเนินการทำให้มีการโอน  
งบประมาณไปตั้งจ่ายจากรายการอื่น ๆ

๓. ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ข้อมูลในระบบไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันทีที่ต้องการ  
นำมาวิเคราะห์และสรุปผลอีกครั้งเพื่อความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน

๔. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีมีจำนวนมากกว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง ทำให้ไม่  
เป็นไปตามเป้าหมายในการวัดความสำเร็จผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

**๕. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙**

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว		ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย	
	เงินงบประมาณ	ร้อยละ	เงินงบประมาณ	ร้อยละ
๑. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒,๔๑๓,๙๕๔	๐.๗๒	๖๑,๐๔๖	๐.๐๒
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๒๗,๔๕๙,๐๐๐	๘.๑๕	๑๙๘,๐๐๐	๐.๐๕
๓. ด้านสังคม	๗๗๖,๐๐๑	๐.๒๓	๑,๐๘๓,๙๙๙	๐.๒๙
๔. ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๘,๒๕๙,๑๔๐	๒.๔๕	๒๐,๘๖๐	๐.๐๐๕
๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๔,๕๐๗,๘๗๓.๔๘	๔.๓๐	๘,๔๗๘,๙๗๖.๕๒	๒.๒๘
๖. ด้านการบริการสาธารณะ	๒๘๓,๖๒๙,๘๒๒	๘๔.๑๕	๓๖๒,๖๓๔,๖๗๘	๙๗.๓๖
<b>รวม</b>	<b>๓๓๗,๐๔๕,๗๙๐.๔๘</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๓๗๒,๔๗๗,๕๕๙.๕๒</b>	<b>๑๐๐</b>

**สรุปผล : การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ ๒,๔๑๓,๙๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๒
- ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณ ๖๑,๐๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ ๒๗,๔๕๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๕
- ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ ๗๗๖,๐๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๓
- ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณ ๑,๐๘๓,๙๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๙

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว**

- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ ๘,๒๕๙,๑๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๕
- ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณ ๒๐,๘๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๕

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ ๑๔,๕๐๗,๘๗๓.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๐
- ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณ ๘,๔๗๘,๙๗๖.๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๘

➢ กัณเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยขออนุมัติกัณเงิน

จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๘,๒๙๐,๐๐๐ บาท

**๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ**

- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ ๒๘๓,๖๒๙,๘๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๕
- ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓๖๒,๖๓๔,๖๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๖

➢ กัณเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยขออนุมัติกัณเงิน

จำนวน ๕๘ โครงการ งบประมาณ ๓๕๐,๖๙๗,๐๐๐ บาท

**สรุปผล :**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ และโครงการเพิ่มเติม จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ และโครงการที่ยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม มีโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ และโครงการที่ยกเลิก จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว มีโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๕ โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗ และโครงการที่เพิ่มเติม จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘


๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี มีโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๖ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๙ โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๕ และโครงการที่เพิ่มเติม จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๘

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ มีโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน ๖๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๗ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๘ โครงการที่ยกเลิก จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๕ และโครงการที่เพิ่มเติม จำนวน ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๐

รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๕ ยกเลิก ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๗ เพิ่มเติม ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๔ ของโครงการทั้งหมด

๔. ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔	๕๐.๐๐	-	-	-	-	๒	๒๕.๐๐	๒	๒๕.๐๐	๘	๑๐๐
๒.ด้านเศรษฐกิจ	๙	๙๐.๐๐	-	-	-	-	๑	๑๐.๐๐	-	-	๑๐	๑๐๐
๓.ด้านสังคม	๕	๓๕.๗๒	-	-	๑	๗.๑๔	๘	๕๗.๑๔	-	-	๑๔	๑๐๐
๔.ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๗	๕๓.๘๕	-	-	-	-	๔	๓๐.๗๗	๒	๑๕.๓๘	๑๓	๑๐๐
๕.ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๓๖	๖๑.๐๒	๘	๑๓.๕๖	๑	๑.๖๙	๑๑	๑๘.๖๕	๓	๕.๐๘	๕๘	๑๐๐
๖.ด้านการบริการสาธารณะ	๖๙	๕๒.๖๗	๒๘	๒๑.๓๘	-	-	๔	๓.๐๕	๓๐	๒๒.๙๐	๑๓๓	๑๐๐
รวม	๑๓๐	๕๕.๓๒	๓๖	๑๕.๓๒	๒	๐.๘๕	๓๐	๑๒.๗๗	๓๗	๑๕.๗๔	๒๓๕	๑๐๐

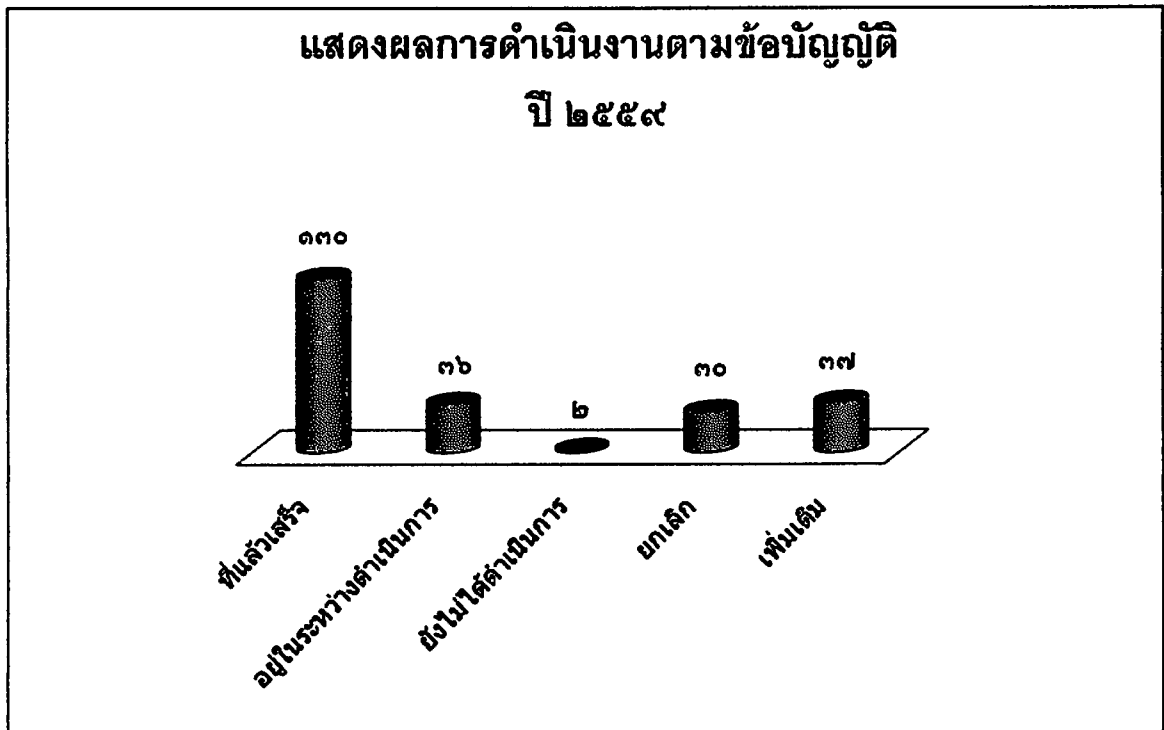

๓. จำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และตามข้อบัญญัติ  
งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

๓.๑ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) กับข้อบัญญัติงบประมาณ  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสามปี	จำนวนโครงการ ตามข้อบัญญัติ	คิดเป็น ร้อยละ
๑. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๖๑	๘	๑๓.๑๑
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๖๘	๑๐	๑๔.๗๑
๓. ด้านสังคม	๘๓	๑๔	๑๖.๘๗
๔. ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๕๐	๑๓	๒๖.๐๐
๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๑๓	๕๙	๕๒.๒๑
๖. ด้านบริการสาธารณะ	๑๘๗	๑๓๑	๗๐.๐๕
รวม	๕๖๒	๒๓๕	๔๑.๘๑

สรุปผล : จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) มีจำนวน  
๕๖๒ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ มีจำนวน ๒๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๑  
ของโครงการทั้งหมด

๓.๒ งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) กับข้อบัญญัติงบประมาณ  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์	จำนวนงบประมาณที่ปรากฏ ตามแผนพัฒนาสามปี	จำนวนงบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	คิดเป็น ร้อยละ
๑. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๗๘,๑๐๐,๐๐๐	๒,๔๗๕,๐๐๐	๓๑.๗๐
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๑๕๘,๐๕๘,๖๔๐	๒๗,๖๕๗,๐๐๐	๑๗.๕๐
๓. ด้านสังคม	๘๙,๐๕๐,๐๐๐	๑,๘๖๐,๐๐๐	๒.๐๙
๔. ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๑๒๐,๖๙๓,๒๐๖	๘,๒๘๐,๐๐๐	๖.๘๖
๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๙๖,๖๐๕,๘๐๐	๒๒,๙๘๖,๘๕๐	๒๓.๗๙
๖. ด้านบริการสาธารณะ	๖๘๓,๒๙๕,๕๓๐	๖๔๖,๒๖๔,๕๐๐	๙๔.๕๘
รวม	๑,๒๒๕,๘๐๓,๑๗๖	๗๐๙,๕๒๓,๓๕๐	๕๗.๘๘

สรุปผล : จำนวนงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) มีจำนวน  
งบประมาณ ๑,๒๒๕,๘๐๓,๑๗๖ บาท จำนวนงบประมาณตามข้อบัญญัติ มีจำนวนงบประมาณ  
๗๐๙,๕๒๓,๓๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๘ ของงบประมาณทั้งหมด

**๒. โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ที่สอดคล้องสนับสนุน ยุทธศาสตร์จังหวัด**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม**

**วิสัยทัศน์จังหวัด “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”**

ประเด็น ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ อบจ. ที่สอดคล้อง สนับสนุน ยุทธศาสตร์จังหวัด	ปี ๒๕๕๙		ปี ๒๕๖๐		ปี ๒๕๖๑		รวม	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาคุณภาพ การเสริมสร้าง ความปลอดภัยและยกระดับ มาตรฐานในการผลิต การตลาดและการส่งออก สินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรม	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒๘	๒๓,๓๐๐,๐๐๐	๒๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๗	๓๓,๐๐๐,๐๐๐	๒๕	๔๖,๓๐๐,๐๐๐
๒. การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ส่วนราชการท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมให้อยู่ในระดับ ต้นของประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๓๘	๑๗,๕๐๐,๐๐๐	๘	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๔	๓,๗๐๐,๐๐๐	๓๕	๓๔,๕๐๐,๐๐๐
	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๓	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๖	๕,๕๐๐,๐๐๐	๖	๘,๕๐๐,๐๐๐	๒๓	๓๐,๒๐๐,๐๐๐
๓. การพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ประชาชนการเสริม สร้างความเป็นคนและ สังคมคุณภาพอย่าง ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๗	๗,๑๐๐,๐๐๐	๔	๔,๓๐๐,๐๐๐	๖	๒,๖๐๐,๐๐๐	๒๒	๑๔,๐๐๐,๐๐๐
	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๓๘	๑๐๒,๒๕๓,๒๐๖	๒๔	๑๗,๘๗๕,๕๘๖	๒๓	๑๘,๗๓๓,๑๘๓	๘๕	๑๓๘,๘๖๑,๙๗๕
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๑๖๔	๖๐๒,๕๘๓,๕๓๐	๑๘๑	๔๓๘,๗๗๓,๘๐๐	๑๘๖	๔๘๖,๕๕๙,๘๖๐	๕๓๑	๑,๕๒๗,๘๑๕,๑๙๖
<b>รวม</b>		<b>๒๗๑</b>	<b>๗๖๙,๕๗๖,๗๓๖</b>	<b>๒๔๘</b>	<b>๕๘๙,๓๘๗,๗๘๖</b>	<b>๒๕๓</b>	<b>๕๓๐,๕๗๑,๐๔๓</b>	<b>๗๖๒</b>	<b>๑,๗๘๙,๕๓๕,๕๖๕</b>

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙๘	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบแม่น้ำท่าจีน ม.๖ ต.หินมูล อ.บางเลน พร้อมทำน้ำ คสล.	๒,๔๒๐,๐๐๐	๐		✓		กันเงิน
๙๙	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบคลองปฏิรูป ๒ ม.๓ - ๔ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล	๒,๙๘๑,๐๐๐	๒,๘๖๕,๐๐๐	✓			
๑๐๐	ก่อสร้างทำน้ำ คสล.เลียบแม่น้ำท่าจีน ม.๓ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี	๑,๙๒๖,๐๐๐	๐				โยธาธิการดำเนินการก่อสร้างเอง โอนสด ๑,๙๒๖,๐๐๐
๑๐๑	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดใต้น้ำ ขนาด ๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	✓			
๑๐๒	ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอง ม.๕ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี		๕,๑๘๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๕,๑๘๐,๐๐๐ กันเงิน
๑๐๓	ก่อสร้างถนนลาดยางฯ สาย ม.๑ ต.ดอนตูม อ.บางเลน เชื่อมต่อ ทต.สามง่าม อ.ดอนตูม		๓,๔๘๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๓,๔๘๐,๐๐๐ กันเงิน
๑๐๔	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๘,๑๒ ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน		๒,๒๙๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๒,๒๙๐,๐๐๐ กันเงิน



ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐๕	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๑๐ ต.ตาก้อง เชื่อมต่อ ต.มาบแค อ.เมืองฯ		๔,๐๑๑,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๔,๐๑๑,๐๐๐ กันเงิน
๑๐๖	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๓,๔,๕ ต.ทุ่งน้อย เชื่อมต่อ ต.สามควายเผือก อ.เมืองฯ		๙,๙๑๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๙,๙๑๐,๐๐๐ กันเงิน
๑๐๗	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๙ ต.มาบแค เชื่อมต่อ ต.ตาก้อง อ.เมืองฯ		๖,๖๔๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๖,๖๔๐,๐๐๐ กันเงิน
๑๐๘	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายเลียบบคลอง ชลประทาน ม.๓ ต.สามควายเผือก อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.ศิระชะทอง อ.นครชัยศรี		๘,๐๐๓,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๘,๐๐๓,๐๐๐ กันเงิน
๑๐๙	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายบ้านศาลแม่ย่า ต.ทัพหลวง เชื่อมต่อ ต.วังตะกูน อ.เมืองฯ		๑,๔๒๒,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๑,๔๒๒,๐๐๐ กันเงิน
๑๑๐	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๑๑ ต.ทัพหลวง เชื่อมต่อ ต.หนองปากโลง อ.เมืองฯ		๕,๔๗๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๕,๔๗๐,๐๐๐ กันเงิน
๑๑๑	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๒ ต.วังตะกูน เชื่อมต่อ ต.นครปฐม อ.เมืองฯ		๙๖๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๙๖๐,๐๐๐ กันเงิน
๑๑๒	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๑ ต.หนองงูเหลือม เชื่อมต่อ ต.ทัพหลวง อ.เมืองฯ		๓,๔๓๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๓,๔๓๐,๐๐๐ กันเงิน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑๓	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๓,๑๑ ต.บางช้าง เชื่อมต่อ ต.คลองจินดา อ.สามพราน		๖,๖๑๒,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๖,๖๑๒,๐๐๐ กันเงิน
๑๑๔	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๑,๗,๘ ต.คลองจินดา เชื่อมต่อ ต.บางช้าง อ.สามพราน		๑๓,๐๘๙,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๑๓,๐๘๙,๐๐๐ กันเงิน
๑๑๕	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายพฤษชาติ ม.๒ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อ ม.๑๐ ต.คลองจินดา อ.สามพราน		๕,๗๕๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๕,๗๕๐,๐๐๐ กันเงิน
๑๑๖	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายวงพาด - ดอนมะขามเทศ ม.๔ ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี เชื่อมต่อกับ ม.๖ ต.คลองจินดา อ.สามพราน		๖,๗๒๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๖,๗๒๐,๐๐๐ กันเงิน
๑๑๗	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๑ ต.ห้วยพลู เชื่อมต่อกับ ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี		๑,๒๒๕,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๑,๒๒๕,๐๐๐ กันเงิน
๑๑๘	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๑,๒ ต.พะเนียด เชื่อมต่อกับ ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี		๔,๓๐๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๔,๓๐๐,๐๐๐ กันเงิน
๑๑๙	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายสีมาร์ทน์ ราษฎร์พัฒนา ม.๖ ต.สัมปทวน เชื่อมต่อกับ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี		๑๒,๓๕๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๑๒,๐๓๕,๐๐๐ กันเงิน


ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒๐	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายหลังวัดศิระชะทอง ม.๑,๒ ต.ศิระชะทอง เชื่อมต่อ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี		๑,๙๙๘,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๑,๙๙๘,๐๐๐ กันเงิน
๑๒๑	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายวังน้ำเขียว - ดอนข่อย ม.๑๒ ต.วังน้ำเขียว เชื่อมต่อ ม.๖ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน		๘,๑๒๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๘,๑๒๐,๐๐๐ กันเงิน
๑๒๒	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายบ้านหนอง หัวช้าง - บ้านหนองกระทุ่ม ม.๔,๒ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน เชื่อมต่อ ต.ลำเหย อ.ดอนตูม		๕,๑๕๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๕,๑๕๐,๐๐๐ กันเงิน
๑๒๓	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๙,๑๑ ต.ห้วยหมอนทอง เชื่อมต่อ ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน		๒,๒๕๘,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๒,๒๕๘,๐๐๐ กันเงิน
๑๒๔	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายไทยรัฐประชา วัฒนา ม.๔,๕ ต.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน		๘,๑๒๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๘,๑๒๐,๐๐๐ กันเงิน
๑๒๕	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สาย ม.๕ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม เชื่อมต่อ ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน		๖,๓๗๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๖,๓๗๐,๐๐๐ กันเงิน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒๖	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ สายเลียบบคลอง ชัยพันธ์ ม.๒,๓ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล เชื่อมต่อ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี		๖,๓๗๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๖,๓๗๐,๐๐๐ กันเงิน
๑๒๗	ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านคั่นใหม่ ม.๖ ต.วังเย็น เชื่อมต่อ ต.บางแพม อ.เมืองฯ		๕,๙๐๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๕,๙๐๐,๐๐๐ กันเงิน
๑๒๘	ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สาย ม.๕ ต.สามควายเผือก อ.เมืองฯ เชื่อมต่อ ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม		๔,๑๓๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๔,๑๓๐,๐๐๐ กันเงิน
๑๒๙	ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สาย ม.๙ ต.บางแพม เชื่อมต่อ เทศบาลนครนครปฐม อ.เมืองฯ		๓,๐๗๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๓,๐๗๐,๐๐๐ กันเงิน
๑๓๐	ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สาย ม.๗,๑๐ ต.บางแพม เชื่อมต่อ ต.วังเย็น อ.เมืองฯ		๕,๗๕๐,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๕,๗๕๐,๐๐๐ กันเงิน
๑๓๑	ค่าก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. เลียบถนนสายบาง แก้วฟ้า ๔ ม.๑ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี		๑,๙๒๖,๐๐๐		✓		โอนเพิ่ม ๑,๙๒๖,๐๐๐ กันเงิน

ภาพประกอบการประชุม  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมเล็กชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

\*\*\*\*\*




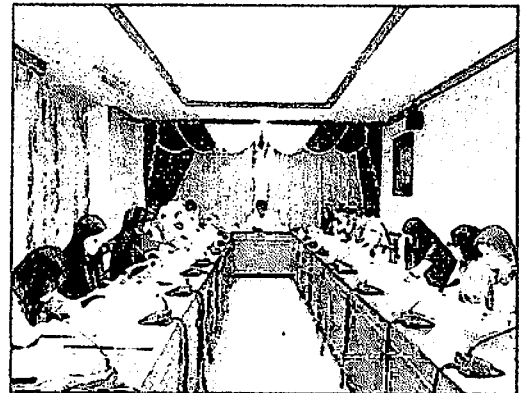


นายทองทิม ราชวงศ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมช่วงไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๘) ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและให้ข้อพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

.....

(ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧) ១ ក្នុងការពិនិត្យស្រាវជ្រាវស្តីពីការប្រើប្រាស់




ឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវស្តីពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវស្តីពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវស្តីពីការប្រើប្រាស់

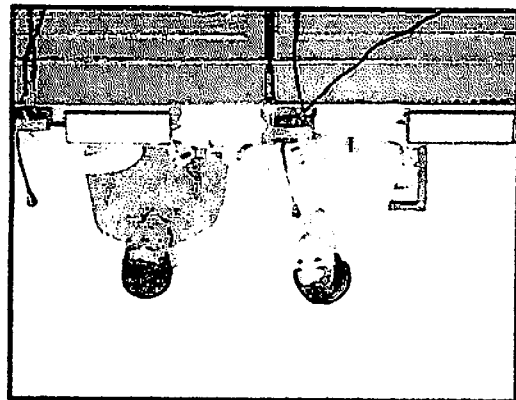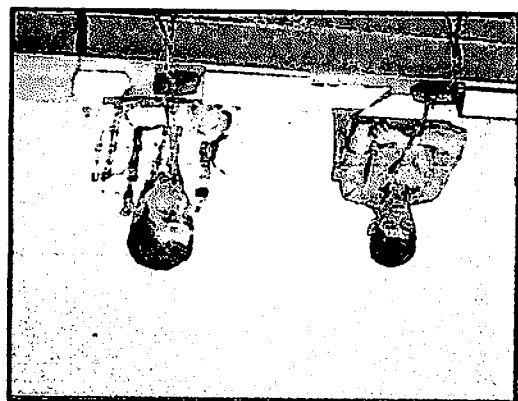

ภาพประกอบการประชุม  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม





\*\*\*\*\*

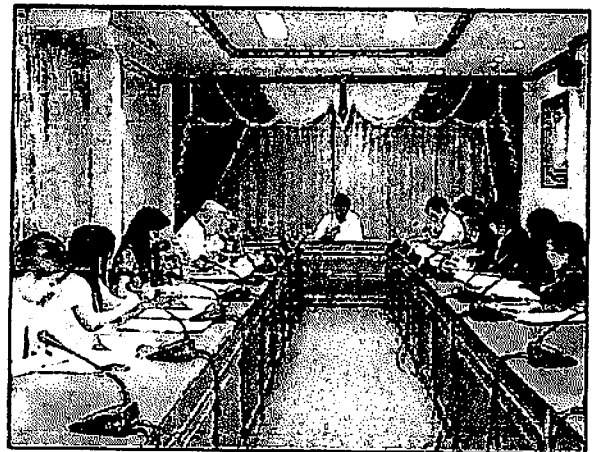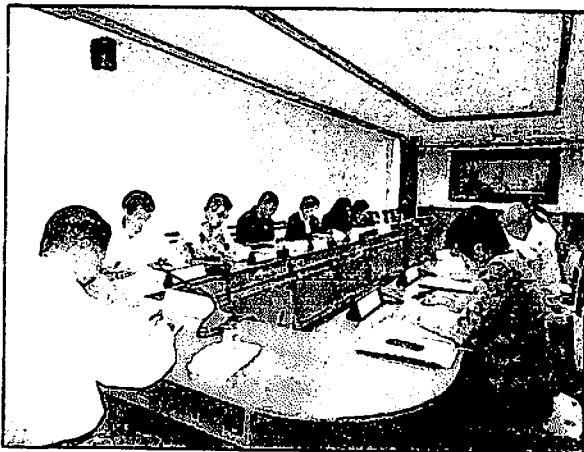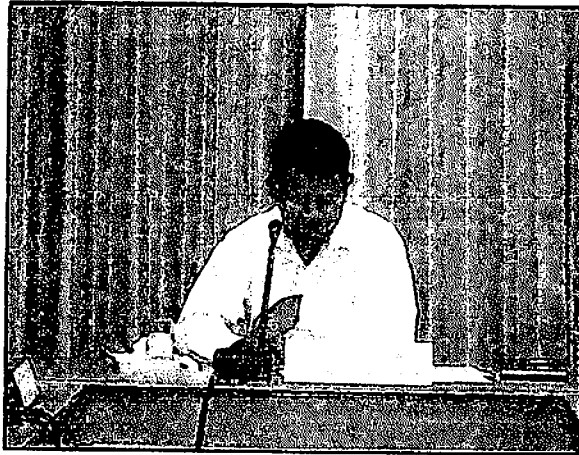

นายทองทิพย์ ราชวงศ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  
การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมช่วงไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๕๙) ซึ่งกำหนดให้มี  
การประชุมภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและให้ข้อพิจารณาเสนอแนะ  
เกี่ยวกับการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

\*\*\*\*\*

(១១១១ មេសេភ្នំពេញ - មេសេបេភ្នំពេញ) ១ ក្នុងការឆ្លងស្រុកស្រុកស្រែសម្រែ  
ភ្នំពេញ មេសេភ្នំពេញ មេសេបេភ្នំពេញ មេសេភ្នំពេញ មេសេបេភ្នំពេញ មេសេភ្នំពេញ មេសេបេភ្នំពេញ

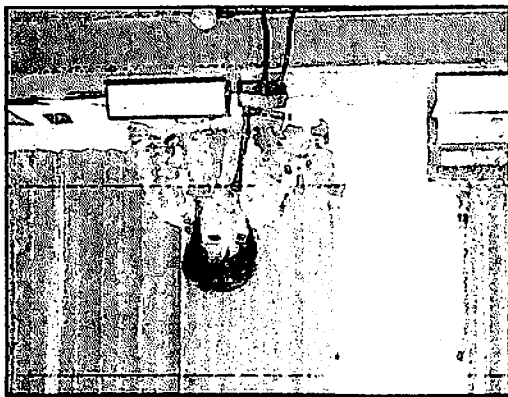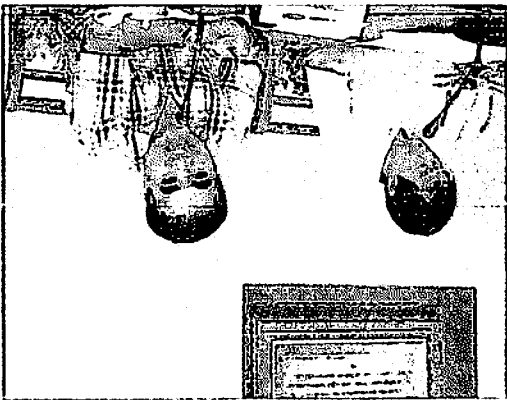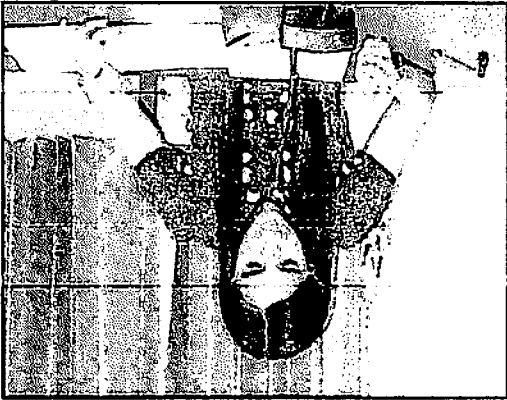



## ภาพประกอบการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
เพื่อคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.๒๕๕๘


วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.


ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

\*\*\*\*\*



นายบัญชา บุญวงศ์ (สมาชิกสภา อบจ.นคร.) เป็นประธานชั่วคราวเพื่อดำเนินการคัดเลือก  
ประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดนครปฐม





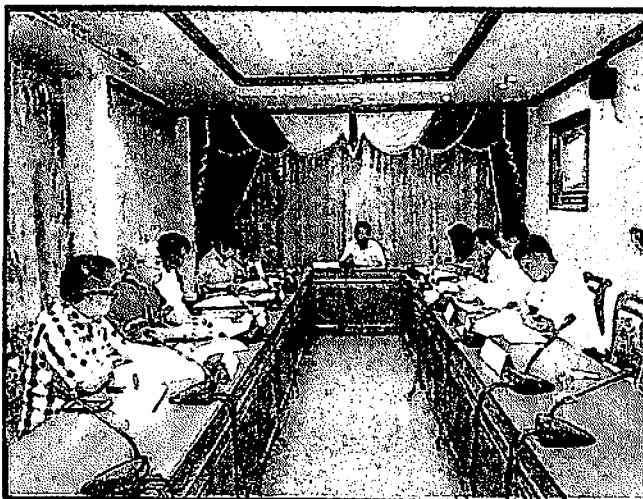


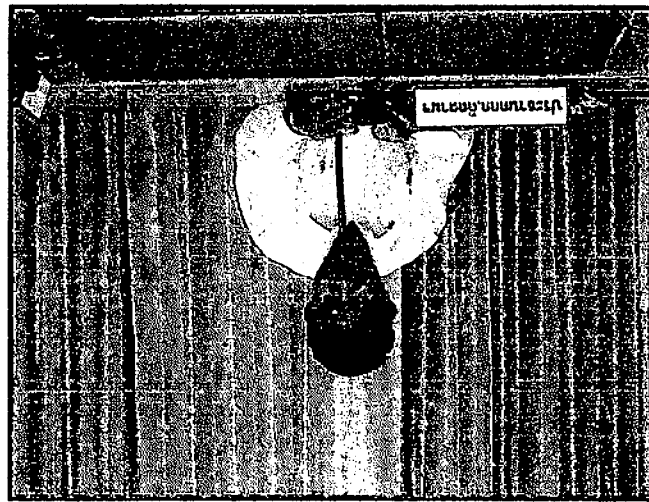

រូបភាពទី ២១

សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមការងាររដ្ឋសម្របសម្រួលសំណើសុំអនុញ្ញាតឱ្យមានការងារសាងសង់ប្រតិបត្តិសេវាសេវាបំណុលរដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញ (ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ) ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ អំពី ការអនុញ្ញាតឱ្យមានការងារសាងសង់ប្រតិបត្តិសេវាសេវាបំណុលរដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញ។

សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមការងាររដ្ឋសម្របសម្រួលសំណើសុំអនុញ្ញាតឱ្យមានការងារសាងសង់ប្រតិបត្តិសេវាសេវាបំណុលរដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ អំពី ការអនុញ្ញាតឱ្យមានការងារសាងសង់ប្រតិបត្តិសេវាសេវាបំណុលរដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញ។

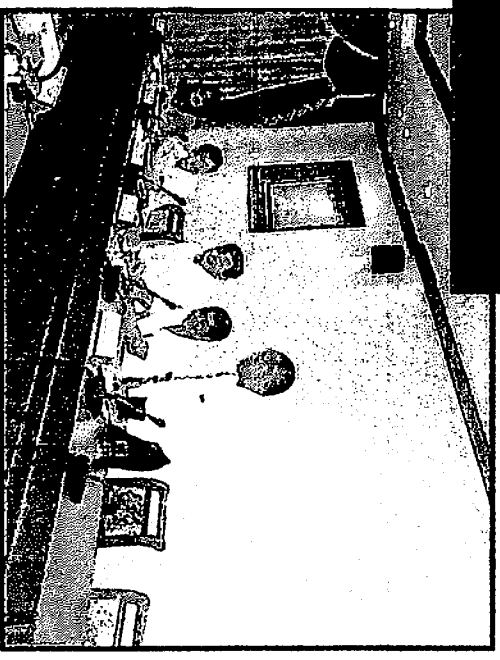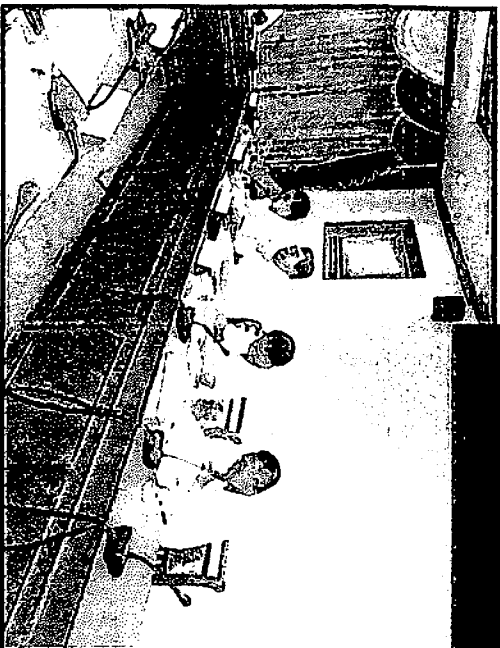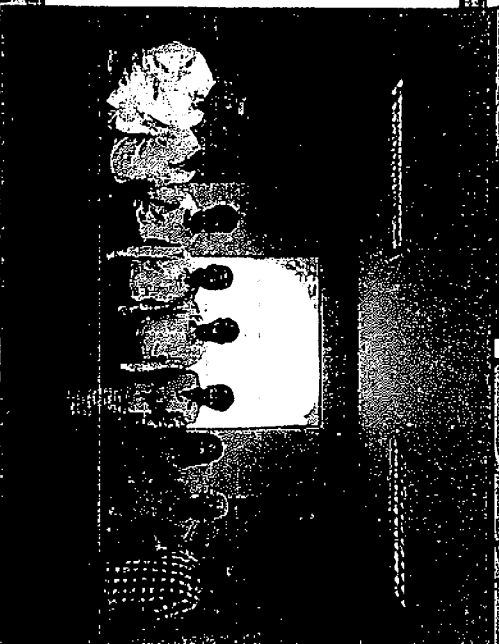
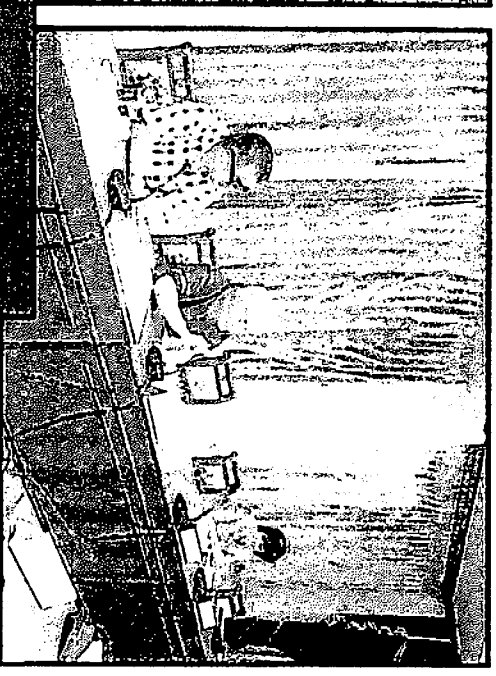
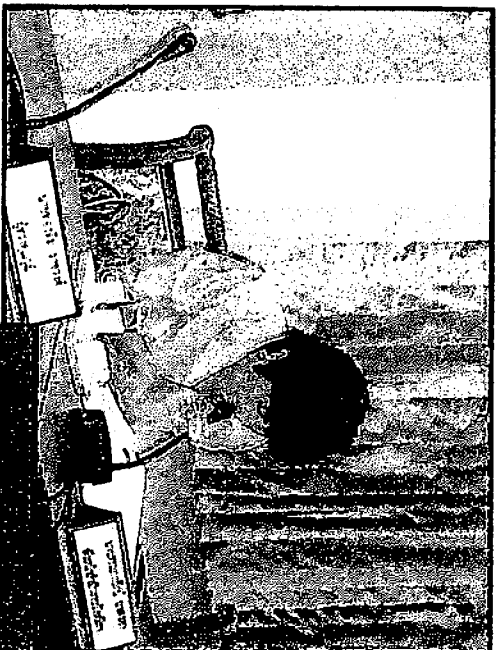


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗)

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

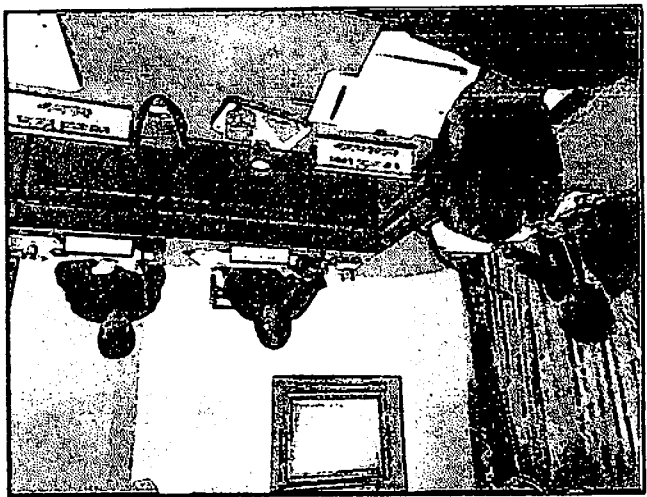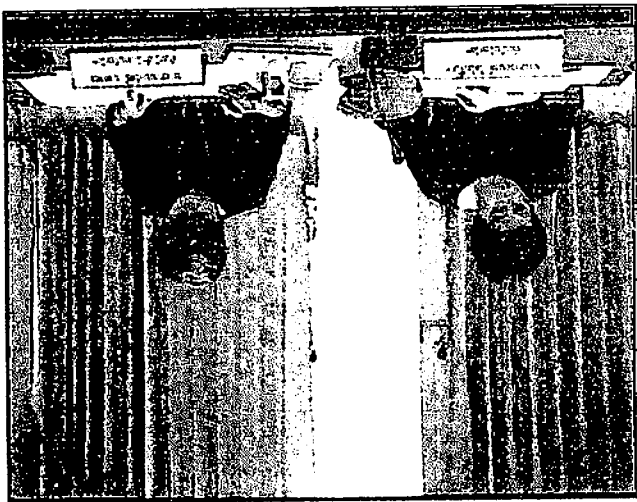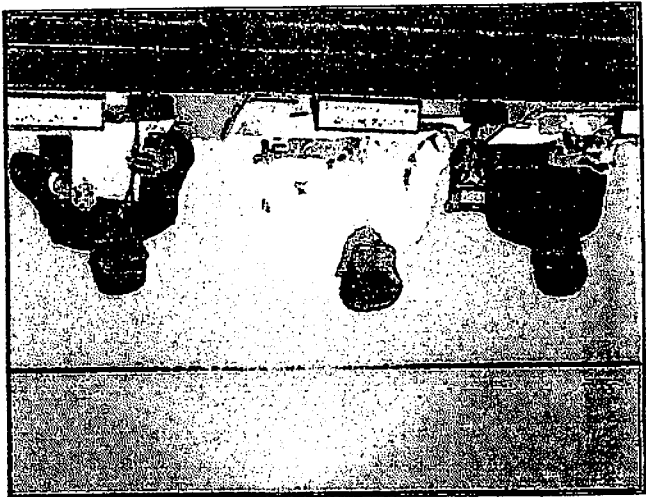

រោងម៉ាស៊ីន

កន្លែងកំពុងសាងសង់ គឺជាបន្ទប់កំពុងសាងសង់ លេខ ១២២ ៣ ក្នុងបន្ទប់ កន្លែងកំពុងសាងសង់បន្ទប់ស្រាវជ្រាវ កន្លែងកំពុងសាងសង់  
បន្ទប់ស្រាវជ្រាវកន្លែងកំពុងសាងសង់ ០១១១ បន្ទប់ស្រាវជ្រាវកន្លែងកំពុងសាងសង់ ៣៣០០ ក្រុមប្រឹក្សាប្រឹក្សាប្រឹក្សាប្រឹក្សាប្រឹក្សា  
កន្លែងកំពុងសាងសង់បន្ទប់ស្រាវជ្រាវកន្លែងកំពុងសាងសង់ ១១១១ បន្ទប់ស្រាវជ្រាវកន្លែងកំពុងសាងសង់ ៣៣០០ ក្រុមប្រឹក្សាប្រឹក្សាប្រឹក្សាប្រឹក្សា  
កន្លែងកំពុងសាងសង់បន្ទប់ស្រាវជ្រាវកន្លែងកំពុងសាងសង់ ១១១១ បន្ទប់ស្រាវជ្រាវកន្លែងកំពុងសាងសង់ ៣៣០០ ក្រុមប្រឹក្សាប្រឹក្សាប្រឹក្សាប្រឹក្សា
